

## 解体工事進捗状況について（令和 8 年 7 月現在）

工 事 名 旧溶融施設(エコスラグセンター)解体撤去工事  
 発 注 者 鳥取県西部広域行政管理組合  
 工 期 令和7年8月22日～令和9年2月26日  
 工 事 場 所 鳥取県西伯郡伯耆町岸本489番地1  
 共同企業体名 東亜・金田・津田建設工事共同企業体

## 【工事概要・作業内容】

近隣の皆様や、通行する車両の安全確保、石綿含有物の除去及びダイオキシン類の除染など、環境対策を十分考慮した作業方法で解体撤去を行います。


## 【現在の作業状況】

管理棟については、基礎撤去をしたコンクリート殻の集積作業を行っています。工場棟については、前回から引き続き進めている建物内の機械設備等の解体、搬出が間もなく完了する予定です。この作業が完了次第、煙突の撤去に着手していきます。


## 《工事状況写真》




管理棟 基礎解体状況

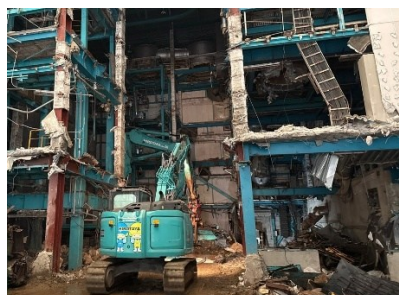

工場棟 機械設備解体状況

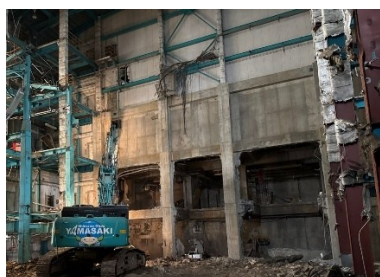

工場棟 機械設備解体状況

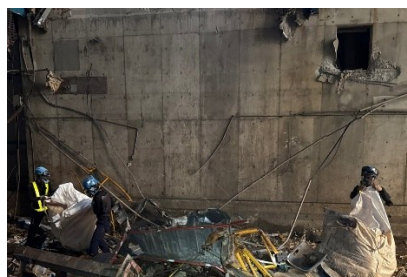

工場棟 解体材分別状況

## 【7月現在の進捗率】

6月末計算の現在の工事の進捗率は56%（計画値56%）で、予定どおり進捗しています。

| 項 目<br>■：計画 ■：実施 | 令和7年 |    |     |     |     | 令和8年 |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     | 令和9年 |    |
|------------------|------|----|-----|-----|-----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|------|----|
|                  | 8月   | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月   | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月   | 2月 |
| 準備工(調査・仮設等)      | ■    | ■  | ■   | ■   | ■   |      |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |      |    |
| 解体工事(工場棟)        |      |    |     |     |     | ■    | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■   | ■   | ■   |      |    |
| 解体工事(管理棟他)       |      |    |     |     |     | ■    | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■   | ■   | ■   |      |    |
| 外構解体             |      |    |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    | ■   | ■   | ■   | ■    | ■  |
| 跡片付工             |      |    |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |      | ■  |

## 【これから（7月、8月）の予定】

7月は、煙突の解体撤去に着手します。

8月は、煙突の解体撤去が完了次第、工場棟の建屋の解体撤去に着手します。
