

## 解体工事進捗状況について（令和8年5月現在）

工 事 名 旧熔融施設(エコスラグセンター)解体撤去工事  
 発 注 者 鳥取県西部広域行政管理組合  
 工 期 令和7年8月22日～令和9年2月26日  
 工 事 場 所 鳥取県西伯郡伯耆町岸本489番地1  
 共同企業体名 東亜・金田・津田建設工事共同企業体

### 【工事概要・作業内容】

近隣の皆様や、通行する車両の安全確保、石綿含有物の除去及びダイオキシン類の除染など、環境対策を十分考慮した作業方法で解体撤去を行います。

### 【現在の作業状況】

管理棟について、粉じん発生を防止するための散水を行いながら、建物の解体撤去を進めています。また、工場棟について、建物内にある機械設備を分解、搬出する作業を進めており、今後、機械設備の搬出が完了次第、建物の解体を進めていきます。


### 《工事状況写真》



管理棟解体状況



管理棟解体状況

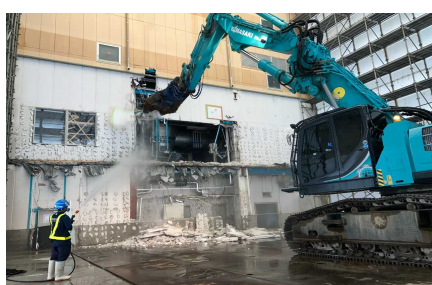

工場棟解体ヤード内外壁取壊し状況



解体材積み込み状況

### 【5月現在の進捗率】

4月末計算の現在の工事の進捗率は48%（計画値46%）で、予定どおり進捗しています。

| 項目<br>■：計画 ■：実施 | 令和7年 |    |     |     |     | 令和8年 |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     | 令和9年 |    |
|-----------------|------|----|-----|-----|-----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|------|----|
|                 | 8月   | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月   | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月   | 2月 |
| 準備工(調査・仮設等)     | ■    | ■  | ■   | ■   | ■   |      |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |      |    |
| 解体工事(工場棟)       |      |    |     |     | ■   | ■    | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■   | ■   | ■   | ■    | ■  |
| 解体工事(管理棟他)      |      |    |     |     | ■   | ■    | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■   | ■   | ■   | ■    | ■  |
| 外構解体            |      |    |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    | ■   | ■   | ■   | ■    | ■  |
| 跡片付工            |      |    |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |      | ■  |

### 【これから（5月、6月）の予定】

5月、6月は、引き続き内部機械の搬出、建屋解体を中心に進めていきます。
