

解体工事進捗状況について（令和8年4月現在）

工 事 名 旧熔融施設(エコスラグセンター)解体撤去工事
 発 注 者 鳥取県西部広域行政管理組合
 工 期 令和7年8月22日～令和9年2月26日
 工 事 場 所 鳥取県西伯郡伯耆町岸本489番地1
 共同企業体名 東亜・金田・津田建設工事共同企業体

【工事概要・作業内容】

近隣の皆様や、通行する車両の安全確保、石綿含有物の除去及びダイオキシン類の除染など、環境対策を十分考慮した作業方法で解体撤去を行います。

【現在の作業状況】

石綿除去・ダイオキシン類除染の作業が完了し、3月24日の検査結果によって、石綿・ダイオキシン類が完全に除去・除染されていることを確認しました。


今後、準備が整い次第、建物内部の機械の搬出や建物の解体を進めていきます。

（4月4日に発生した強風により、防音のために足場を覆っているシートの一部が外れる事案が発生しました。周辺環境等への影響はありませんが、近隣住民の皆様には大変ご心配をおかけし申し訳ございませんでした。今後は、防音シートの緊結部の補強等の措置を講じ、再発防止に努めます。）

《工事状況写真》



管理棟石綿除去状況

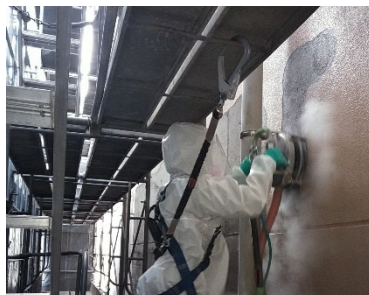

工場棟外壁石綿除去状況



工場棟解体ヤード設置状況



工場棟解体ヤード設置完了

【4月現在の進捗率】

3月末計算の現在の工事の進捗率は40%（計画値39%）で、予定どおり進捗しています。

項目 ■：計画 ■：実施	令和7年					令和8年												令和9年	
	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
準備工(調査・仮設等)	■	■	■	■	■														
解体工事(工場棟)					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
解体工事(管理棟他)					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
外構解体															■	■	■	■	■
跡片付工																			■

【これから（4月、5月）の予定】

4月、5月は石綿、ダイオキシン設備等の後片付け、内部機械の搬出、建屋解体を中心に進めていきます。
