

解体工事進捗状況について（令和8年6月現在）

工 事 名 旧溶融施設(エコスラグセンター)解体撤去工事
 発 注 者 鳥取県西部広域行政管理組合
 工 期 令和7年8月22日～令和9年2月26日
 工 事 場 所 鳥取県西伯郡伯耆町岸本489番地1
 共同企業体名 東亜・金田・津田建設工事共同企業体

【工事概要・作業内容】

近隣の皆様や、通行する車両の安全確保、石綿含有物の除去及びダイオキシン類の除染など、環境対策を十分考慮した作業方法で解体撤去を行います。

【現在の作業状況】

管理棟については、建屋の解体が完了し、基礎撤去を進めています。工場棟については、建物内にある機械設備を分解、搬出する作業を進めており、今後、機械設備の搬出が完了次第、建物の解体を進めていきます。その他の煙突等についても、解体の準備を進めています。


《工事状況写真》



管理棟 基礎解体状況



工場棟 機械設備解体状況

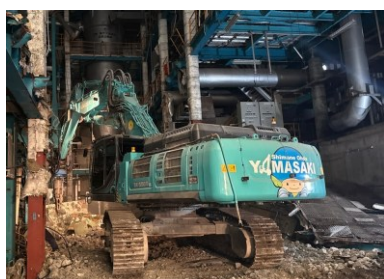

工場棟 機械設備解体状況



工場棟 解体材分別状況

【6月現在の進捗率】

5月末計算の現在の工事の進捗率は51%（計画値50%）で、予定どおり進捗しています。

項 目 ■：計画 ■：実施	令和7年					令和8年												令和9年	
	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
準備工(調査・仮設等)	■	■	■	■	■														
解体工事(工場棟)						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
解体工事(管理棟他)						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
外構解体															■	■	■	■	■
跡片付工																			■

【これから（6月、7月）の予定】

6月、7月は、引き続き、管理棟の基礎撤去、工場棟の内部機械の搬出作業を中心に行い、工場棟建屋の解体に着手予定です。並行して、煙突の解体にも着手予定です。
