

解体工事進捗状況について（令和8年7月現在）

工 事 名 旧溶融施設(エコスラグセンター)解体撤去工事
 発 注 者 鳥取県西部広域行政管理組合
 工 期 令和7年8月22日～令和9年2月26日
 工 事 場 所 鳥取県西伯郡伯耆町岸本489番地1
 共同企業体名 東亜・金田・津田建設工事共同企業体

【工事概要・作業内容】

近隣の皆様や、通行する車両の安全確保、石綿含有物の除去及びダイオキシン類の除染など、環境対策を十分考慮した作業方法で解体撤去を行います。


【現在の作業状況】

管理棟については、基礎撤去をしたコンクリート殻の集積作業を行っています。工場棟については、前回から引き続き進めている建物内の機械設備等の解体、搬出が間もなく完了する予定です。この作業が完了次第、煙突の撤去に着手していきます。


《工事状況写真》




管理棟 基礎解体状況

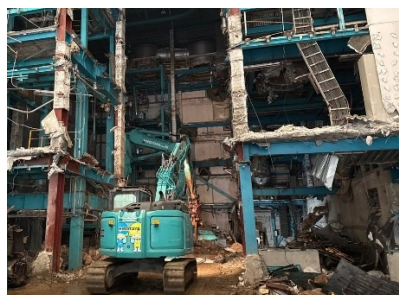

工場棟 機械設備解体状況

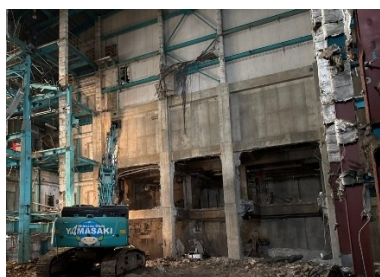

工場棟 機械設備解体状況

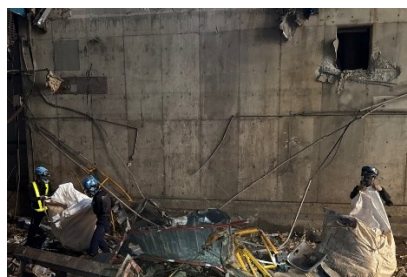

工場棟 解体材分別状況

【7月現在の進捗率】

6月末計算の現在の工事の進捗率は56%（計画値56%）で、予定どおり進捗しています。

項 目 ■：計画 ■：実施	令和7年					令和8年												令和9年	
	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
準備工(調査・仮設等)	■	■	■	■	■														
解体工事(工場棟)						■	■	■	■	■	■	■							
解体工事(管理棟他)						■	■	■	■	■	■	■							
外構解体															■	■	■	■	■
跡片付工																			■

【これから（7月、8月）の予定】

7月は、煙突の解体撤去に着手します。

8月は、煙突の解体撤去が完了次第、工場棟の建屋の解体撤去に着手します。
