

解体工事進捗状況について（令和8年8月現在）

工 事 名 旧溶融施設(エコスラグセンター)解体撤去工事
 発 注 者 鳥取県西部広域行政管理組合
 工 期 令和7年8月22日～令和9年2月26日
 工 事 場 所 鳥取県西伯郡伯耆町岸本489番地1
 共同企業体名 東亜・金田・津田建設工事共同企業体


【工事概要・作業内容】

近隣の皆様や、通行する車両の安全確保、石綿含有物の除去及びダイオキシン類の除染など、環境対策を十分考慮した作業方法で解体撤去を行います。

【現在の作業状況】

煙突の解体及び建物（工場棟、スラグ貯留棟を除く）の基礎の撤去が完了し、コンクリート殻の集積、搬出作業を行っています。工場棟については、建物の解体へ向けて準備を行っており、完了次第、建物の解体に着手します。

《工事状況写真》

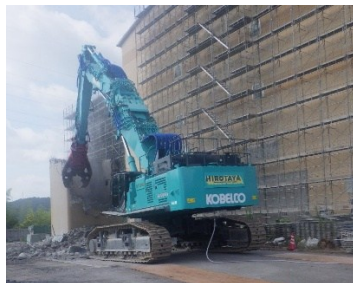

煙突棟 煙突解体状況



車庫棟 基礎（床版）解体状況



煙突棟 煙突基礎解体状況



洗車棟 基礎解体撤去状況

【8月現在の進捗率】

7月末計算の現在の工事の進捗率は64%（計画値63%）で、予定どおり進捗しています。

項 目 ■：計画 ■：実施	令和7年					令和8年												令和9年	
	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
準備工(調査・仮設等)	■	■	■	■	■														
解体工事(工場棟)						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
解体工事(管理棟他)						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
外構解体															■	■	■	■	■
跡片付工																			■

【これから（8月、9月）の予定】

8月は、工場棟建屋の解体撤去の準備をします。

9月は、工場棟建屋の解体撤去に着手します。
